



Rectorado

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

# RESOLUCIÓN RECTORAL

## N°258 -2021-UNTRM/R

Chachapoyas, 11 JUN 2021

### VISTO:

El Oficio N° 318-2021-UNTRM-R/DGA-UIGA, de fecha 01 de junio del 2021, mediante el cual, el Jefe de la Unidad de Infraestructura y Gestión Ambiental, solicita la emisión del acto resolutorio aprobando la Liquidación Técnica Financiera del Proyecto de Inversión Pública con C.U.I 2166789: Creación e Implementación de Ambientes Administrativos para la Facultad de Enfermería de la UNTRM Chachapoyas-Chachapoyas-Amazonas, y;

### CONSIDERANDO:

Que, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, organiza su Régimen de Gobierno de acuerdo a Ley Universitaria-N° 30220, su Estatuto y Reglamentos, atendiendo a sus necesidades y características;

Que, el Artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, referente a la liquidación de contrato de obra, señala que el contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida la oferta, debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes;

Que, con Resolución Rectoral N° 892-2012-UNTRM/R, de fecha 05 de diciembre del 2012, se resuelve aprobar el Expediente Técnico de la obra: "Creación e Implementación de Ambientes Administrativos para la Facultad de Enfermería de la UNTRM Chachapoyas-Chachapoyas-Amazonas", con un valor total de S/ 2 313 834.99 (Dos millones trescientos trece mil ochocientos treinta y cuatro con 99/100 nuevos soles), siendo la modalidad de ejecución por contrata, con un plazo de ejecución de 150 días calendario;

Que, mediante Resolución Rectoral N° 812-2014-UNTRM/R, de fecha 17 de setiembre del 2014, se aprueba la liquidación final de la Obra "Creación e Implementación de Ambientes Administrativos para la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas", cuyo costo total asciende a S/. 1 781 396 (Un millón setecientos ochenta y un mil trescientos noventa y seis con 12/100 soles);

Que, mediante Contrato N° 0037-2020-UNTRM-R/DGA, de fecha 24 de junio del 2020, se celebra entre la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas y de otra Consultores y Ejecutores Macr E.I.R.L representado por el señor Max Alberth Culqui Ruiz, en adelante el consultor, con la finalidad de elaborar la liquidación técnica y financiera del proyecto de inversión Pública con C.U.I. 2166789: Creación e Implementación de Ambientes Administrativos para la Facultad de Enfermería de la UNTRM Chachapoyas-Chachapoyas-Amazonas; cumpliendo con las siguientes actividades: Elaboración de los informes de liquidación físico y financiera del proyecto, recabar información primaria del proyecto, coordinar con el responsable del proyecto y/o la Dirección de Infraestructura y Gestión Ambiental para la recopilación y alcance de la información física; en el plazo de 60 días, cuyo monto asciende a la suma de S/ 30 000.00 (Treinta mil y 00/100 soles);





Rectorado

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

## RESOLUCIÓN RECTORAL

### Nº 258 -2021-UNTRM/R

Que, mediante Carta N° 013-2020/CE-MAR E-I-R-L, de fecha 08 de diciembre del 2020, el Consultor remite al Jefe de la Infraestructura y Gestión Ambiental el Expediente de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto de inversión Pública con C.U.I. 2166789: Creación e Implementación de Ambientes Administrativos para la Facultad de Enfermería de la UNTRM Chachapoyas-Chachapoyas-Amazonas;



Que, mediante Oficio N° 616-2020-UNTRM-R/DGA-UIGA, de fecha 11 de diciembre del 2020, el Jefe de la Infraestructura y Gestión Ambiental, remite el expediente Creación e Implementación de Ambientes Administrativos para la Facultad de Enfermería de la UNTRM Chachapoyas-Chachapoyas-Amazonas, al Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, para su revisión y de ser el caso emita conformidad;



Que, mediante Informe N° 14-2021-UNTRM-DGA-UEI/MYL, de fecha 28 de enero del 2021, el Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, informa en relación al Expediente de la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto de Inversión Pública "Creación e Implementación de Ambientes Administrativos para la Facultad de Enfermería de la UNTRM Chachapoyas-Chachapoyas-Amazonas", con C.U.I. 2166789, lo siguiente:

#### 1.- ANTECEDENTES

El Expediente de Liquidación Técnica-Financiera fue remitido por la DGA mediante proveído en documento: OFICIO N° 616-2020-UNTRM-R/DGA-UIGA y presentaron observaciones en fecha 21 enero 2021; reingresando el Expediente de Liquidación el día miércoles 27 de enero con las observaciones levantadas por el responsable de su elaboración.



2.- El Proyecto de Inversión inició su ejecución en el año 2013, continuándose durante los siguientes años 2014 y 2015 en que culmina el proyecto.

En presente año 2020, se le asignó un monto ascendente a s/. 30,000.00 para la Liquidación de la Inversión Según Perfil y Expediente Técnico el Proyecto está comprendido por los Componentes:

- Infraestructura: Construcción ambientes Administrativos para la facultad de Enfermería
- Equipamiento: Equipo e Implementación de Ambientes
- Gestión del proyecto
- Estudios Definitivos



3.- La Liquidación Técnica-Financiera ha sido elaborada por la Empresa CONSULTORES Y EJECUTORES MACR E.I.R.L. mediante Contrato N°0037-2020-UNTRM-R/DGA/DE/SDABA, cuyo contenido corresponde a lo estipulado en las disposiciones y normatividad vigente.



4.- Revisada la Liquidación Técnica-Financiera se refleja la ejecución física de la Inversión en 92.00% obtenido de la ejecución de la inversión y su monto actualizado registrado en Sistema.

Las Metas ejecutadas y liquidadas reflejadas en sus Componentes son:

- Construcción ambientes Administrativos para la facultad de Enfermería
- Equipamiento e Implementación de Ambientes Administrativos
- Gestión del proyecto
- Supervisión
- Estudios Definitivos



Rectorado

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

# RESOLUCIÓN RECTORAL

## N° 258 -2021-UNTRM/R

5.- Los Presupuestos asignados al Proyecto de Inversión han sido los siguientes:

AÑO	PIM
2,013	1,503,810.00
2,014	620,754.00
2,015	56,803.00
2,020	30,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>s/. 2,211,367.00</b>

6.- Respecto a la ejecución financiera de la Inversión producto de la liquidación, se ha obtenido una ejecución total ascendente a S/. 2,128,615.84 constituyendo un porcentaje de ejecución del 96.26% respecto a los Presupuestos asignados (PIM).

El monto asignado (s/. 30,000.00) en PIM 2020, que constituye el pago del servicio por la elaboración de la Liquidación Técnica-Financiera se agregará al monto liquidado mediante un informe complementario una vez producido el devengado.

Se presenta cuadro resumen de los Presupuestos asignados, montos ejecutados y saldo por devengar de la Inversión:

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTOS (S/)
PERFIL TÉCNICO	2,453,297.00
EXPEDIENTE TÉCNICO	2813,834.99
MONTO ASIGNADOS (PIM)	2,211,367.00
DESCRIPCIÓN	MONTO
LIQUIDACIÓN DE INVERSIÓN	2,128,615.84
SALDO POR DEVENGAR	30,000.00

El detalle de los Componentes ejecutados se muestra en presente cuadro según Liquidación obtenida:

DETALLE	TOTAL S/
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LA FACULTAD DE ENFERMERÍA	1,781,395.20
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS	174,747.56
GESTIÓN DEL PROYECTO	137,198.09
SUPERVISIÓN	20,825.00
ESTUDIOS DEFINITIVOS	14,449.99
<b>TOTAL DE EJECUCIÓN</b>	<b>2,128,615.84</b>

7.- En razón de lo descrito en los párrafos precedentes y estando bajo las consideraciones establecidas en la Ley N°3028 de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Directiva N°001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la Directiva



Rectorado

\*Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia\*

## RESOLUCIÓN RECTORAL

### N° 258 -2021-UNTRM/R

Procedimiento para la Liquidación Técnica-Financiera y Cierre de Proyectos de Inversión Pública con Componentes de Infraestructura, Educativo y Otros” de la UNTRM, se concluye que el Costo del Proyecto de Inversión producto de la Liquidación Técnica-Financiera asciende a la suma de s/. 2,128,615.84 (Dos millones ciento veinte y ocho mil seiscientos quince con 84/100 soles), otorgándose la conformidad, recomendándose continuar con los trámites respectivos.

Que, mediante Informe N° 017-2021-UNTRM-R/DGA-DIGA-SDEP/RIOR-PT, de fecha 28 de enero del 2021, el Ingeniero Civil de la Unidad de Infraestructura y Gestión Ambiental, brinda conformidad a la Liquidación Técnico Financiera del Proyecto de Inversión Pública **“Creación e Implementación de Ambientes Administrativos para la Facultad de Enfermería de la UNTRM Chachapoyas-Chachapoyas-Amazonas”**, con CUI 2166789 y SNIP N° 239262, y manifiesta lo siguiente:

#### 1. ANTECEDENTES:

En relación al documento se verifica que se alcanzó el expediente de la liquidación técnica financiera del proyecto: Código Único de Inversiones -N° 2166789 **“Creación e Implementación de Ambientes Administrativos para la Facultad de Enfermería de la UNTRM Chachapoyas-Chachapoyas-Amazonas”**.

Con oficio N° 616-2020-UNTRM-R/DGA-UIGA la Unidad de Infraestructura y Gestión Ambiental remite el expediente en mención a la Unidad Ejecutora de Inversiones para la revisión respectiva, de igual manera con proveído de la Unidad Ejecutora de Inversiones, se remite a la Dirección General de Administración por presentar algunas observaciones, las mismas que se subsanaron el 27 de enero del presente.

El Proyecto en mención inicia su ejecución en el año 2013, continuándose durante los siguientes años 2014 y 2015 en que culmina el proyecto.

En el año 2020, se le asignó un monto ascendente a S/ 30,000.00 para la liquidación de la Inversión.


- Según el Perfil y Expediente Técnico el Proyecto está comprendido por los Componentes:  
Infraestructura: Construcción de Ambientes Administrativos para la facultad de Enfermería.
- Equipamiento: Equipo e implementación de Ambientes.
- Gestión del Proyecto.
- Estudios Definitivos.

La liquidación Técnico - Financiera ha sido elaborada por la Empresa CONSULTORES Y EJECUTORES MACR E.I.R.L. mediante el CONTRATO N°0037-2020-UNTRM-R/DGA/DE/SDABA, cuyo contenido corresponde a lo estipulado en las disposiciones y normatividad vigente.

Revisada la Liquidación Técnica - Financiera se refleja la ejecución física de la Inversión en 92% obtenido de la ejecución de la inversión y su monto actualizado registrado en Sistema. Las metas ejecutadas y liquidadas reflejadas en sus Componentes son:

- Infraestructura: Construcción de Ambientes Administrativos para la facultad de Enfermería.
- Equipamiento: Equipo e implementación de Ambientes.
- Gestión del Proyecto.
- Estudios Definitivos.

Los Presupuestos asignados al Proyecto de Inversión han sido los siguientes:

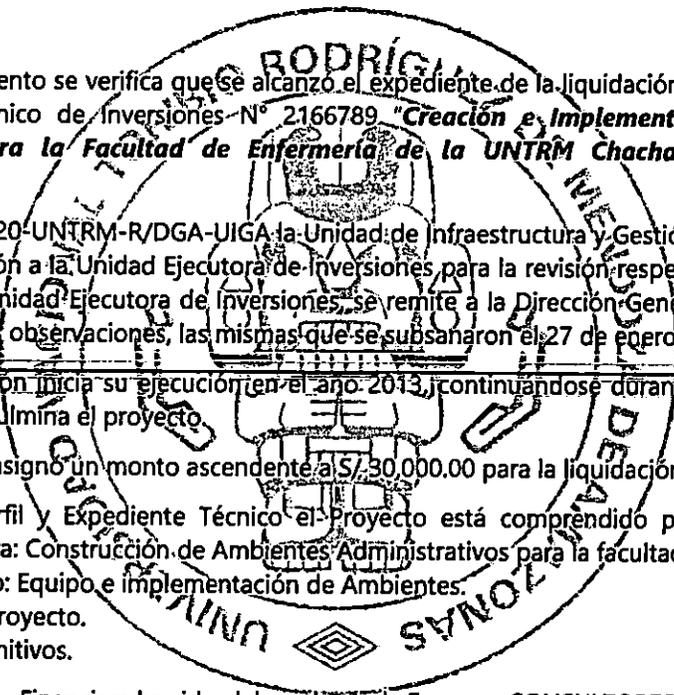



Rectorado

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

RESOLUCIÓN RECTORAL

Nº 258 -2021-UNTRM/R

AÑO	PIM
2013	1,503,810.00
2014	620,754.00
2015	56,803.00
2020	30,000.00
<b>TOTAL S/ 2,211,367.00</b>	

Respecto a la ejecución financiera de la inversión producto de la liquidación, se ha obtenido una ejecución total ascendente S/ 2,128,615.84 constituyendo un porcentaje de ejecución del 96.26% respecto a los Presupuestos asignados (PIM).

Monto asignado (S/ 30,000.00) en el PIM 2020, que constituye el pago del servicio por la elaboración de la Liquidación Técnica - Financiera se agregará al monto liquidado mediante un informe complementario una vez producido el devengado.

Se presenta cuadro de resumen de los Presupuestos asignados, montos ejecutados y saldo por devengar de la Inversión:

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTOS (S/)
Perfil Técnico	2,453,297.00
Expediente Técnico	2,315,834.99
Monto Asignados (PIM)	2,211,367.00
DESCRIPCIÓN	MONTO
LIQUIDACIÓN DE INVERSIÓN	2,128,615.84
Saldo por devengar	30,000.00

El detalle de los Componentes ejecutados se muestra en el presente cuadro según Liquidación obtenida:

DETALLE	TOTAL S/
Construcción de ambientes administrativos para la Facultad de Enfermería	11,781,395.20
Equipamiento e implementación de ambientes administrativos	174,747.56
Gestión del Proyecto	137,198.09
Supervisión	20,825.00
Estudios Definitivos	14,449.99
<b>TOTAL DE EJECUCIÓN</b>	<b>2,128,615.84</b>

Manifestando que con Informe N° 0014-2021-UNTRM-DGA-UEI/MYL, la Unidad Ejecutora de Inversiones, manifiesta la CONFORMIDAD respectiva al Expediente de Liquidación Técnica Financiera del Proyecto de Inversión;

Que, con Oficio N° 089-2021-UNTRM-R/DGA-UIGA, de fecha 19 de febrero del 2021, el Jefe de la Unidad de Infraestructura y Gestión Ambiental, solicita al Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones, informe complementario a la Liquidación Técnica Financiera del Proyecto C.U.I. N° 2166789: "Creación e



Rectorado

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

# RESOLUCIÓN RECTORAL

## N° 258 -2021-UNTRM/R

**Implementación de Ambientes Administrativos para la Facultad de Enfermería de la UNTRM Chachapoyas-Chachapoyas-Amazonas**, manifestando lo siguiente: i) Que, con Informe N° 017-2021-UNTRM-R/DGA-UIGA-SDEP/RIOR-PT, la Unidad de Infraestructura y Gestión Ambiental, brinda conformidad a la **Liquidación Técnica Financiera del Proyecto** C.U.I. N.° 2166789: "**Creación e Implementación de Ambientes Administrativos para la Facultad de Enfermería de la UNTRM Chachapoyas-Chachapoyas-Amazonas**"; ii) Que, con el INFORME N° 014-2021-UNTRM-DGA-UEI/MYL, la Unidad Ejecutora de Inversiones manifiesta la **conformidad** correspondiente a la **Liquidación Técnica Financiera del Proyecto** C.U.I. N.° 2166789: "**Creación e Implementación de Ambientes Administrativos para la Facultad de Enfermería de la UNTRM Chachapoyas-Chachapoyas-Amazonas**", de acuerdo al siguiente detalle:



DETALLE

TOTAL

Construcción de los ambientes	S/ 1,781,395.20
Equipamiento e implementación de ambientes administrativos	S/ 174,747.56
Gestión del Proyecto	S/ 137,198.09
Supervisión	S/ 20,825.00
Estudios definitivos	S/ 14,449.99
<b>TOTAL DE EJECUCIÓN</b>	<b>S/ 2,128,615.84</b>



v) Que, parte de la ejecución de gasto del proyecto en mención, es el pago por servicio de Elaboración de la Liquidación Técnica Financiera del proyecto de inversión, cuyo monto de acuerdo al contrato N.° 0037-2020-UNTRM-R/DGA/DE/SDABA, es de **S/ 30,000.00** (treinta mil con 00/100 Soles), el mismo que **no es considerado al momento de la presentación del expediente**, teniendo en cuenta la **CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO:** "**El pago es realizado luego de la conformidad emitida por la Unidad de Infraestructura y Gestión Ambiental y la conformidad del responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones**", y por consiguiente, no contar con Comprobante de pago emitido por la Unidad de Tesorería. En ese contexto solicita que emita **el informe complementario** para proceder con la emisión del Acto Resolutivo de la Liquidación Técnica Financiera del Proyecto, considerando que se ejecutó el pago al Contratista mediante el Comprobante de pago N.° 10597 de fecha 28 de enero de 2021 (adjunto al presente), por el monto establecido en el contrato;

Que, mediante Informe N°595-2021-UNTRM- R/DGA-UEI, de fecha 05 de abril del 2021, el Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones-UNTRM, remite al Jefe de la Unidad de Infraestructura y Gestión Ambiental, el informe complementario de la Liquidación Técnica Financiera del Proyecto "**Creación e Implementación de Ambientes Administrativos para la Facultad de Enfermería de la UNTRM Chachapoyas-Chachapoyas-Amazonas**", con C.U.I. N° 2166789 y SNIP N° 239262, manifestando lo siguiente:

### 1.- ANTECEDENTES

El Expediente de Liquidación Técnica Financiera del Proyecto de Inversión ha sido elaborado por la Empresa Consultores y Ejecutores MACR E.I.R.L. según Contrato N°0037-2020-UNTRM-R/DGA/DE/SDABA.



Rectorado

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

# RESOLUCIÓN RECTORAL

## N° 258 -2021-UNTRM/R

La Liquidación de la Inversión cuenta con la conformidad de la Unidad de Infraestructura y Gestión Ambiental mediante los documentos OFICIO N°089-2021-UNTRM-R/DGA-UIGA e INFORME N°017-2021-UNTRM-R/DGA-DIGA-SDEP/RIOR-PT; así mismo con la conformidad de la Unidad Ejecutora de Inversiones mediante el INFORME N°014-2021-UNTRM-DGA-UEI/MYL.

Con OFICIO N°038-2021-UNTRM-R/DGA-UIGA de fecha 28 de enero del 2021, el Jefe de la Unidad de Infraestructura y Gestión Ambiental solicita el pago por el servicio de Liquidación Técnica-Financiera de la Inversión a la Dirección General de Administración por el monto de s/. 30,000.00.

### 2.- MONTO DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA-FINANCIERA OBTENIDA POR EMPRESA PROVEEDOR DE SERVICIO

El monto obtenido producto de la Liquidación Técnica-Financiera de la Inversión es ascendente a la cantidad de: s/ 2,128,615.84 (Dos millones ciento veinte y ocho mil seiscientos quince con 84/100 soles).

### 3.- MONTO DEFINITIVO DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA-FINANCIERA

Considerando que en el año 2020 la Inversión conto con un PIM ascendente a s/. 30,000.00 para el pago del servicio de la Liquidación; por lo que se le adiciona el referido monto para la obtención del monto definitivo de la Liquidación Técnica-Financiera.

- Monto de Liquidación Técnica-Financiera obtenido 2,128,615.84
- Costo del Servicio de Liquidación 30,000.00

**Monto Total de Liquidación Técnica-Financiera : 2,158,615.84**

El Monto Total de Liquidación del Proyecto de Inversión asciende a la suma de s/ 2,158,615.84

### 4.- DOCUMENTOS DE PAGO SERVICIO DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA-FINANCIERA

FECHA	REG. SIAF	N° COMPROBANTE	PROVEEDOR	DENOMINACIÓN GASTO	F. F.	IMPORTE
28/01/21	9892	10597	Consultores y Ejecutores MACR E.I.R.L.	Servicio Elaborac. Liquidac Técnica-Financ. de Proy. C.U. N°2166879	R.O.	30,000.00
28/12/20	9892	Orden de Servicio N°0004428	Consultores y Ejecutores MACR E.I.R.L.	Servicio Elaborac. Liquidac Técnica-Financ. de Proy. C.U. N°2135373	R.O.	
<b>TOTAL</b>						<b>30,000.00</b>

Concluyendo que el monto total de liquidación Técnica -Financiera del Proyecto de Inversión "Creación e Implementación de Ambientes Administrativos para la Facultad de Enfermería de la UNTRM Chachapoyas-Chachapoyas-Amazonas", asciende a la suma de: s/. 2,158,615.84 (Dos millones ciento cincuenta y ocho mil seiscientos quince con 84/100 soles);



Rectorado

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

# RESOLUCIÓN RECTORAL

## N° 258 -2021-UNTRM/R

Que, con Oficio de visto, el Jefe de la Unidad de Infraestructura y Gestión Ambiental, manifiesta: **i)** Que, mediante el Informe N.° 017-2021-UNTRM-R/DGA-DIGA-SDEP/RIOR-PT, de fecha 28 de enero de 2021, se emite la **conformidad** a la Liquidación Técnica Financiera del Proyecto de Inversión Pública C.U.I 2166789: "**Creación e Implementación de Ambientes Administrativos para la Facultad de Enfermería de la UNTRM Chachapoyas-Chachapoyas-Amazonas**", por parte de la Unidad de Infraestructura y Gestión Ambiental; **ii)** Que, con Informe N.° 014-2021-UNTRM-DGA-UEI/MYL, de fecha 28 de enero de 2021, se emite la **conformidad** a la Liquidación Técnica Financiera del Proyecto de Inversión Pública C.U.I 2166789: "**Creación e Implementación de Ambientes Administrativos para la Facultad de Enfermería de la UNTRM Chachapoyas-Chachapoyas-Amazonas**", por parte de la Unidad Ejecutora de Inversiones; **iii)** Que, parte de la ejecución de gasto del proyecto en mención, es el pago por el servicio de la Elaboración de la Liquidación Técnica Financiera del Proyecto, cuyo monto asciende a S/ 30,000.00 (Treinta mil con 00/100 Soles) y es cancelado de acuerdo a lo establecido en el Contrato N.° 0037-2020-UNTRN-R/DGA/DE/SDABA, CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO: "**El servicio materia del presente Contrato se cancelará en una sola armada, luego de la conformidad emitida por la Dirección de Infraestructura y Gestión Ambiental y el informe favorable emitido por el responsable de la Sub Dirección de Programación Multianual de Inversiones**"; **iv)** Que, mediante Oficio N.° 089-2021-UNTRM-R/DGA-UIGA, se solicitó a la Unidad Ejecutora de Inversiones, el Informe Complementario para proceder con la solicitud de emisión del acto resolutorio de la liquidación técnica financiera del proyecto, considerando que se ejecutó el pago al contratista mediante comprobante de pago N.° 10597 de fecha 28 de enero de 2021, por el monto establecido en el contrato, para ser adicionado al total de la inversión; **v)** Que mediante informe N° 595-2021-UNTRM/R-DGA-UEI de fecha 05 de abril de 2021, se emite el informe complementario por parte de la Unidad Ejecutora de Inversiones, manifestando el monto total de la liquidación del Proyecto de Inversión Pública con C.U.I 2166789: "**Creación e Implementación de Ambientes Administrativos para la Facultad de Enfermería de la UNTRM Chachapoyas-Chachapoyas-Amazonas**"; por lo que solicita que la emisión del acto resolutorio que apruebe la Liquidación Técnica Financiera del Proyecto de Inversión Pública con C.U.I 2166789: "**Creación e Implementación de Ambientes Administrativos para la Facultad de Enfermería de la UNTRM Chachapoyas-Chachapoyas-Amazonas**", de acuerdo al siguiente detalle:

DÉTALE	TOTAL
Construcción de los Ambientes	S/ 1,781,395.20
Equipamiento e implementación de ambientes administrativos	S/ 174,747.56
Gestión del Proyecto	S/ 137,198.09
Supervisión	S/ 20,825.00
Estudios Definitivos	S/ 14,449.99
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 2,128,615.84</b>
Costo del Servicio de Liquidación	S/ 30,000.00
<b>MONTO TOTAL DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>S/ 2,158,615.84</b>

Asimismo manifiesta que, la Unidad brinda la conformidad respectiva, a la documentación presentada, para continuar con los trámites respectivos;

Que, estando a las consideraciones citadas y las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria N° 30220, al Rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas;



Rectorado

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

RESOLUCIÓN RECTORAL

N° 258 -2021-UNTRM/R

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación Técnica Financiera del proyecto: "Creación e Implementación de Ambientes Administrativos para la Facultad de Enfermería de la UNTRM Chachapoyas-Chachapoyas-Amazonas", con CUI 2166789 y SNIP N° 239262, cuyo costo total asciende S/ 2,158,615.84 (Dos millones ciento cincuenta y ocho mil seiscientos quince con 84/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE	TOTAL
Construcción de los Ambientes	S/ 1,781,395.20
Equipamiento e implementación de ambientes administrativos	S/ 174,747.56
Gestión del Proyecto	S/ 137,198.09
Supervisión	S/ 20,825.00
Estudios Definitivos	S/ 14,449.99
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 2,128,615.84</b>
Costo del Servicio de Liquidación	S/ 30,000.00
<b>MONTO TOTAL DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>S/ 2,158,615.84</b>

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Dirección General de Administración realice la incorporación de la obra mencionada en el artículo primero de la presente resolución en el patrimonio institucional.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a los estamentos internos de la Universidad, interesados, Contratista, Supervisor, DIGA, UEL, UE, de forma y modo de Ley para conocimiento y fines.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Pellegrino Chauca Valqui Dr. RECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

DRA. CARMEN ROSA HUAMAN MUÑOZ SECRETARÍA GENERAL
